



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. โทร. ๐-๕๕๖๖-๖๓๕๘
ที่ บร.๘๓๓/๐๑./๒๐ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

เรื่องเดิม

ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก และสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้


โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เดือน ตุลาคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ๒๑ โครงการ
- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ๔,๒๘๕,๕๓๘.๑๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายพิสนุกรณ์ พิรักษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายวัลลภ สุขคำชา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

นาย



(นายสุรินทร์ รวพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง



(นายอิสรพงษ์ เสนคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เดือน ตุลาคม – มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. นโยบายการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (บ้านนายสมนึก พลอยกระโทก ถึงบ้านบุญเหลือทองชุมแสง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (บ้านนายอ้อน โสณกระโทก ถึงสวนนางฝัน อินทร์ทรงเส้นคลองสามัคคี ๑๓)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (บ้านนางผาสุก จุ้ยชุมแสง ถึง บ้านนายแหลมทอง ศรีอินทร์)	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นในวัดสระสะแก)	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอย ช้างวัด ช่างพี่เหลือ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (หน้าบ้านนายธงชัย รงค์กระโทก ถึง สวนนางสี ต่างกลาง ซอยสมฤดี – ไทยเจริญ)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม ๔	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (แยกมุม โรงเรียน ถึงบ้านนางมาลีทิพย์ หมายแก้วกลาง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บ้านนางสมปอง ถึง หน้าบ้านนายณรงค์ ตีมาก)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บ้านหนองโบสถ์ ซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่เหลือ)	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (เส้นในโรงเรียนบ้านหนองมัน)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๓,๗๕๒,๐๐๐	๓,๗๓๐,๐๐๐	

1. นโยบายการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค(ต่อ)

2. แผนงานและชุมชน (งานไฟฟ้า)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม			หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ บ้านถนอมถั่ว	๑๖๖,๑๗๖.๑๖	๑๖๖,๑๗๖.๑๖	ดำเนินการแล้ว
2	อุดหนุนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
3	อุดหนุนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระสะแก	๑๐,๘๕๖	๑๐,๘๕๖	ดำเนินการแล้ว
รวม		๑๗๘,๐๓๒.๑๖	๑๗๘,๐๓๒.๑๖	

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาสภาพภายใน				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

2.แผนงานการศึกษา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว
3	โครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
รวม		๗๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	

แผนงานสารสนเทศฯ วิจัยนวัตกรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดจ้าง/เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๕,๕๓๖	โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๕,๕๓๖	

๓.แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)				
ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่จัดจ้าง/ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย	๒๕,๐๐๐	๔๕,๙๗๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ ดำเนินการ แล้ว
	รวม	๒๕,๐๐๐	๔๕,๙๗๐	

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดการวันเด็กแห่งชาติ



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง




โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย



โครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางผาสุก จุ้ยชุมแสง ถึง บ้านนายแหลมทอง ศรีอินทร์) หมู่ที่ ๓

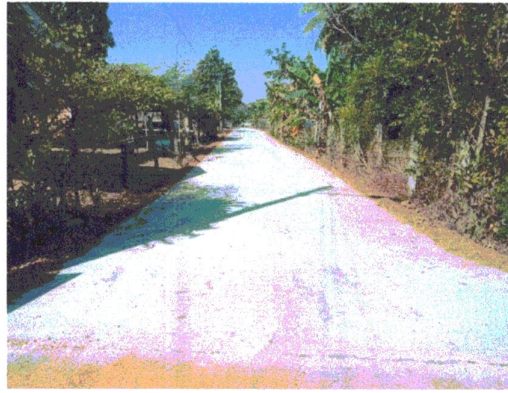


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.ม.๓ (เส้นคลองสามัคคี ๑๓ จากบ้านนายออน โสนกระโทก ถึง สวนนางผัน อินทร์ทรง)) หมู่ที่ ๓



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัดช่วงที่เหลื่อ) หมู่ที่ ๔



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสมฤดี -ไทยเจริญ หน้าบ้านนายธงชัย ธงกระโทก ถึง สวนนางสี ต่างกลาง) หมู่ที่ ๕

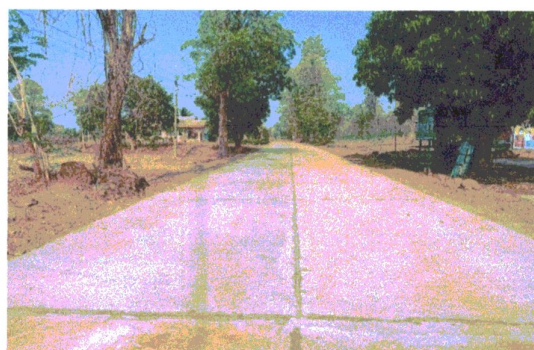

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายในโรงเรียนหนองมัน) หมู่ที่ ๗



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกมุม โรงเรียน ถึงบ้านนางมาลีทิพย์ หมายแก้วกลาง) หมู่ที่ ๘



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางบ้านนางสมปอง พิริक्षा -หน้าบ้านนายณรงค์ ดีมาก) หมู่ที่ ๙



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ ๑๐

